

## TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2023

**PROSJEKT:** Nye Førde sjukehus  
**FØRETAK:** Helse Førde HF  
**DATO:** 08.09.2023

---



*Stortingspresidenten på besøk i Livabygget*

## 1. Status regionale byggeprosjekt

Sluttprognosen for Livabygget og Svana 1 blir samla rapportert til å ligge 40 millionar over budsjett, og i tillegg er det no teke inn ein auke i kostnadsindeksen som er vurdert å treffe desse prosjekta med omlag 90 millionar

På grunn av den vanskelege økonomiske situasjonen er ombyggingsprosjekta Svana 2 og Svana 3 er utsett på ubestemt tid. Det er i gjennomføringsplanen definert eit lite prosjekt, Svana mini, der det er lagt inn kritiske delar frå Svana 2 og Svana 3.


Nye Førde sjukehus blir no rapportert mot eit kostnadsmål på 1,875 milliardar, som er 100 millionar under den vedtekne ramma i 2023 kroner.

| Helseføretak   | Prosjektnamn  | Framdrift | Risiko | Økonomi |
|----------------|---------------|-----------|--------|---------|
| Helse Førde HF | Infrastruktur | ●         | ●      | ●       |
| Helse Førde HF | Livabygget    | ●         | ●      | ●       |
| Helse Førde HF | Svana 1       | ●         | ●      | ●       |

## 2. Framdrift

Framdrifta er god og arbeid med delprosjekta Liva og Svana 1 ligg litt framfor planen

Milepelar for dei to delprosjekta:

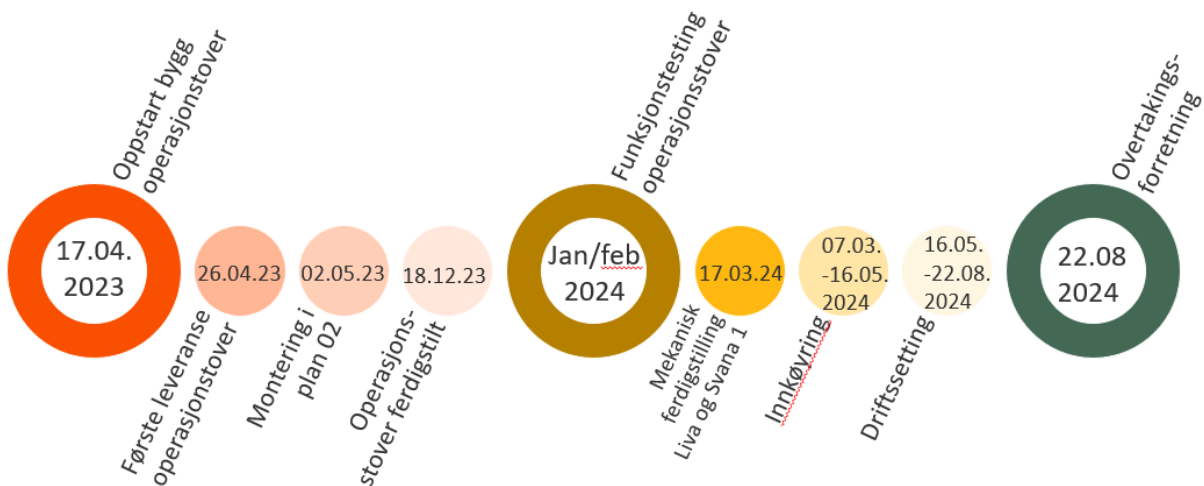

### 3. Risiko

Dei største risikoane i prosjektet er no knytt til utstyr og utstyrsanskaffing, samt grensesnitt mellom entreprise for operasjonsstover og totalentreprenør Veidekke.

Dialogen med entreprenør er god, og det er ingen omtvista saker.

### 4. Økonomi

Oppdatert sluttprognose for delprosjekta og totalprosjektet.

|                 | Akkumulerte kostnader per 31.12.22 | Totalbudsjett (i 2021-kroneverdi jf. styresak 007/21) | Siste prisjustering totalbudsjett (01.01.2023) | Siste oppdaterte sluttprognose 2023 kroner (01.05.2023) | Kostnader inneverande år (2023) |                    |                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                    |   |  |   | Hittil i år                     | Resten av året     | Estimat 2023       | Budsjett 2023      |
| Dagabygget      | 333 346 042                        | 335 983 584   | 334 000 000                                    | 333 346 042   | -                               | -                  | -                  | -                  |
| Infrastruktur   | 82 471 663                         | 86 256 058  | 88 300 000                                     | 91 124 179  | 2 858 629                       | 5 793 887          | 8 652 516          | 8 652 516          |
| Livabygget      | 524 472 167                        | 1 044 000 000   | 1 087 700 000                                  | 1 218 782 917   | 266 219 488                     | 223 797 512        | 490 017 000        | 490 017 000        |
| Svana 1         | 88 139 793                         | 161 026 546   | 168 600 000                                    | 182 219 213   | 38 980 040                      | 25 108 960         | 64 089 000         | 64 089 000         |
| Svana Mini      | -                                  | -   | 32 000 000                                     | 32 000 000  | 1 534 075                       | 2 465 925          | 4 000 000          | 4 000 000          |
| Svana 2         | 17 535 358                         | 208 999 150   | 200 600 000                                    | 17 535 358  | -                               | -                  | -                  | -                  |
| Svana 3         | -                                  | 70 000 000  | 63 800 000                                     | -   | -                               | -                  | -                  | -                  |
| <b>Sum bygg</b> | <b>1 045 965 023</b>               | <b>1 906 265 338</b>                                  | <b>1 975 000 000</b>                           | <b>1 875 007 709</b>                                    | <b>309 592 232</b>              | <b>257 166 284</b> | <b>566 758 516</b> | <b>566 758 516</b> |
